


EJEMPLO COMPARATIVO AVANCE DE PROYECTOS



Implementación eTod+GIS en Estados CAR Y SAM

P/01 Cuestión 2 del Orden del Día
República Dominicana

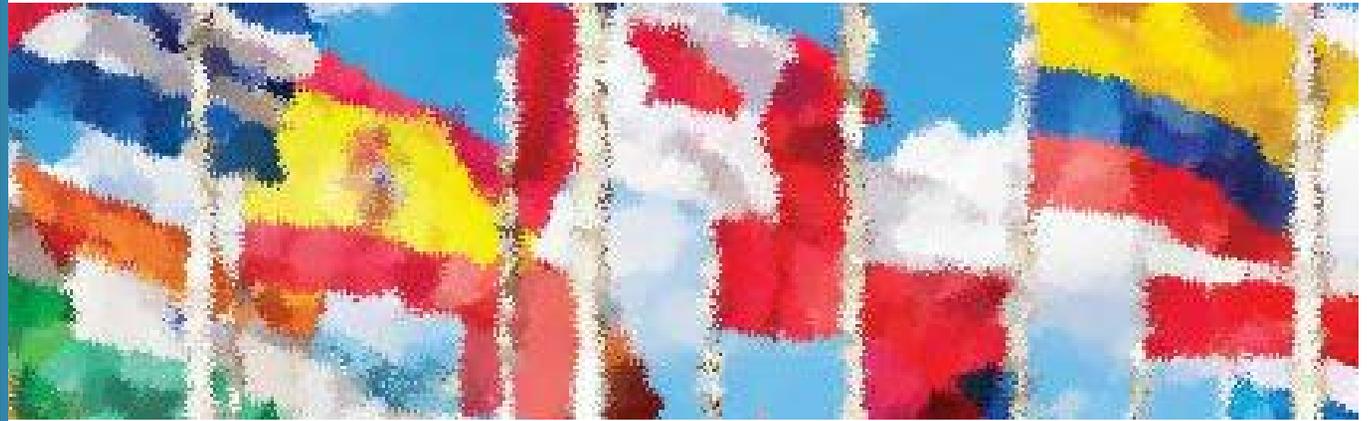

OBJETIVO

- *Realizar una relación comparativa entre la implementación de los proyectos De eTOD de la Región CAR y SAM.*
- *Establecer una propuesta de mejora para la ejecución de estos proyectos , tomando en consideración las directrices de gestión de proyectos.*





Como parte del Plan Mundial para la Navegación Aérea han surgido iniciativas para desarrollar proyectos que de manera conjunta entre los Estados, han permitido el desarrollo y el fomento de tecnologías de punta para mantener la seguridad operacional en los más altos estándares.

Dentro de estas iniciativas se encuentra los proyectos de Implantación del eTOD en los estados CAR y SAM. Este permitirá el levantamiento de los obstáculos en las diferentes áreas circundantes a los aeródromos, mitigando la posibilidad de accidentes en los mismos.





PROBLEMÁTICA

Los Proyectos en implementación han presentado un retraso considerable en su ejecución debido a problemas de planificación.

Esto ha desencadenado un estado de descontento entre los Estados ya que no se ha podido culminar esta fase del Plan, para desarrollar sus subsecuentes actividades.






SISTEMA DE IMPLEMENTACIÓN

Los proyectos eTod en ejecución se han realizado bajo un esquema de gestión disgregado. Esto se evidencia en la falta de desglose de las tareas subsecuentes a la tarea principal, ocasionando que no se tenga un objetivo preciso en el momento de la implementación de la actividad.

El método propuesto de Gestión de Proyectos nos permitirá un mejor desglose de cada una de las tareas, sus responsables y tiempos de entrega, permitiendo así un avance sistemático y organizado del proyecto.

Dentro de este método de implementación se pueden realizar cambios en varios tópicos del proyecto y redirigirlos a la planificación, logrando reestructurar el tiempo de desarrollo de cada actividad y sus tareas conjuntas; obteniendo una reprogramación del proyecto y visualizando su impacto a corto, medio y largo plazo.






EJEMPLO COMPARATIVO AVANCE PROYECTO





ESQUEMA DE GESTION DE PROYECTOS

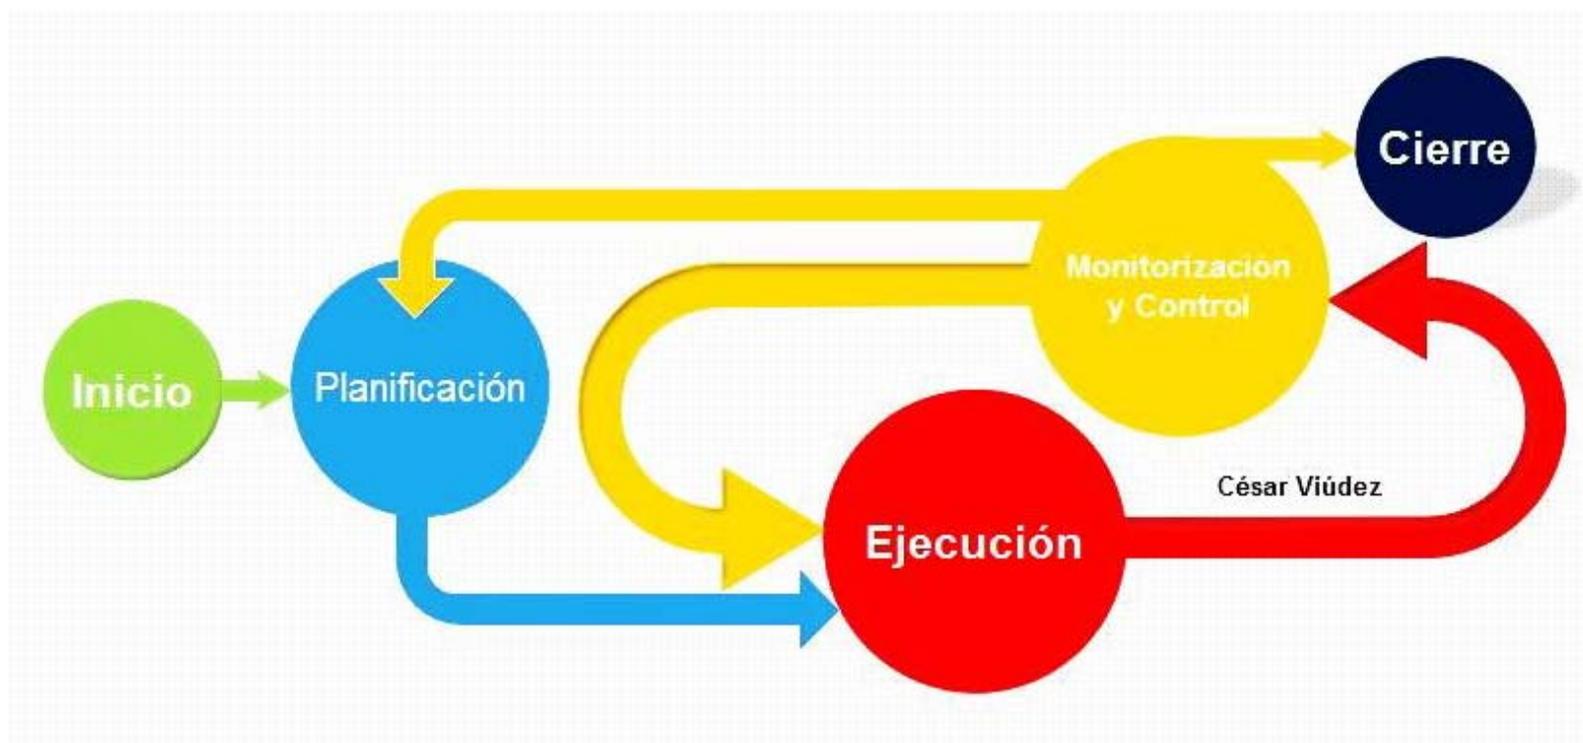

ESTRATEGIAS	JUSTIFICACIÓN	REGIÓN	PROYECTOS RELACIONADOS	Fecha inicio	F
<p>...ción de las actividades del Proyecto será coordinada a las comunicaciones entre los miembros del proyecto, el director del proyecto y el coordinador del programa, mediante a través de teleconferencias (aplicación Go To así como eventuales reuniones que se puedan realizar oportunamente, según las actividades del programa de trabajo.</p> <p>...ador de Proyecto coordinará con el Coordinador de ... la incorporación de expertos adicionales sugeridos por ... os, de conformidad con las tareas y trabajos a realizarse. ... ados, serán sometidos por el Coordinador del Programa, a ... eración de los expertos de los Estados, en forma de ... ito consolidado para su análisis, revisión y aprobación. ... resentado al CRPP del GREPECAS</p>	<p>Para el cumplimiento de los SARPS del Anexo 15 y el Anexo 4, que faciliten la aplicación de las operaciones aéreas basadas en la performance y avanzar en la Hoja de Ruta de la Transición del AIS al AIM, es necesaria una estrecha relación con otros proyectos, con el fin de recolectar los requisitos operacionales demandados por las aplicaciones mencionadas y sus fechas de implantación tentativas.</p>	CAR	<p>El Proyecto G1 AIM "Desarrollos para el suministro de los datos electrónicos sobre el terreno y los obstáculos (eTOD) relacionados con los Proyectos G2 " Gestión de Información/datos Aeronáuticos" y G3 "Evaluación y desarrollo del QMS aplicado al AIM en los Estados de la Región SAM"</p>	26/09/11	3
<p>...ción de las actividades del Proyecto será coordinada a las comunicaciones entre miembros del proyecto, el director del proyecto y el coordinador del programa mediante a través de teleconferencias (aplicación ... ting) así como eventuales reuniones que se puedan ... n eventos oportunos según las actividades del programa ...</p> <p>...ador de Proyecto coordinara con el Coordinador de ... la incorporación de expertos adicionales si lo ameritan ... y trabajos a realizarse. Los resultados de los trabajos ... s, serán sometidos a consideración y revisión por los ... de los Estados en forma de documento final de ... iación para su análisis, revisión y aprobación y ... ión al CRPP del GREPECAS por el Coordinador del</p>	<p>Cumplimiento de los SARPS Anexo 15 y Anexo 4 para facilitar la aplicación de las operaciones aéreas basadas en la performance y avanzar en la Hoja de Ruta de la Transición del AIS al AIM. Es necesaria una estrecha relación con otros proyectos con el fin de recolectar los requisitos operacionales demandados por las aplicaciones mencionadas y sus respectivas fechas tentativas de implantación.</p>	SAM	<p>Se relaciona con los Proyectos G2 " Gestión de Información/datos Aeronáuticos" y G3 "Evaluación y desarrollo del QMS aplicado al AIM en los Estados de la Región SAM"</p>	1/3/2012	1/

- Ejemplo Comparativo Proyecto eTOD Regiones CAR/SAM

SEAMOS UNO



- MUCHAS GRACIAS!!

