



Troisième réunion du Comité de pilotage (SC/3) du Projet de développement coopératif des services de météorologie aéronautique dans la Région AFI (Projet CODEVMET-AFI)

Yaoundé, (Cameroun), du 28 au 30 novembre 2022

Point 4 de l'ordre du jour : État d'avancement du projet depuis la réunion SC/2

WP4.1 État de mise en œuvre du projet

(Présenté par le Secrétariat)

RÉSUMÉ _ _	
<p>Cette note de travail présente l'état de la mise en œuvre des activités du projet comme planifiée pour l'année 2022.</p> <p>La suite à donner par la réunion est indiquée au paragraphe 3</p>	
<p>RÉFÉRENCES</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Accord de gestion de Service (MSA) ▪ Document révisé du projet CODEVMET-AFI ▪ Rapport CODEVMET-AFI SC/2 	
<p><i>Objectifs stratégiques</i></p>	<p><i>A – Sécurité, B – Capacité et efficacité de la navigation aérienne</i></p>

1 INTRODUCTION


- 1.1. La deuxième réunion du Comité de pilotage (SC/2) du Projet de développement coopératif des services de météorologie aéronautique dans la Région AFI (CODEVMET-AFI) s'est tenue virtuellement du 22 au 23 juillet 2021.
- 1.2. La réunion a pris la décision 2/5 approuvant le document de projet révisé pour guider la mise en œuvre du projet pendant sa période de planification et la décision 2/9 pour approuver le plan de travail du projet pour la période 2022 - 2024 avec une date de début effective en janvier 2022 par décision. 2/6.
- 1.3. Cette note de travail présente l'état des livrables et des activités connexes prévues pour 2022.

2 DISCUSSIONS

2.1 Selon le ProDoc révisé du projet CODEVMET-AFI et le plan de travail du projet, les résultats attendus en termes de livrables résultant de la mise en œuvre des activités connexes prévues pour 2022 sont les suivants :

- Livrable 0.1 : Sélectionner des experts ressources compétents pour apporter une assistance aux États dans la mise en œuvre des activités du projet
- Livrable 1.1 : Réglementations génériques, documents d'orientation, procédures opérationnelles, outils techniques, directives et procédures liées au système de gestion de la qualité.
- Livrable 1.2 : Soumission des plans d'action des États, suivi et assistance pour la mise en œuvre des activités liées à la supervision de la sécurité MET et au système de gestion de la qualité.

2.2 L'aperçu de l'état des réalisations des livrables 0.1, 1.1 et 1.2 est donné la la figure 1. Les livrables 0.1 et 1.1 sont achevés tandis que le livrable 1.2 est en cours.

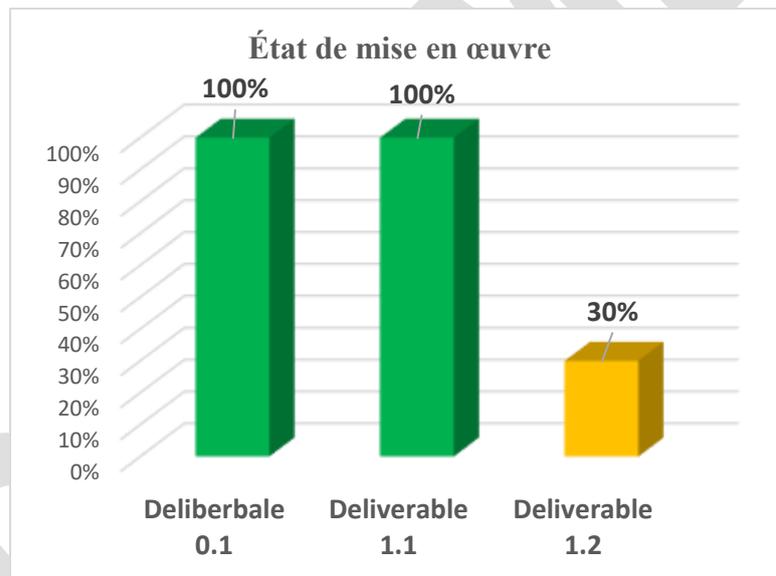

2.3 Le livrable 1.2 est en cours avec une activité, à savoir l'atelier de familiarisation sur les objectifs du projet et la stratégie de mise en œuvre entièrement réalisée pour les pays francophones. Dix-huit (18) participants représentant sept (7) États et un (1) ANSP ont participé à l'atelier. Les experts ressources du projet et les représentants des États/ANSP ont discuté de la situation réglementaire et opérationnelle actuelle des États et ont travaillé à l'élaboration du plan d'action des États membres actifs, à savoir le Cameroun et la Côte d'Ivoire. Ils ont également examiné la situation du Sénégal signataire du MSA et ayant promis de confirmer son statut de membre actif.

2.4 L'atelier de familiarisation pour les pays anglophones est en cours de préparation pour une mise en œuvre en février 2023, comme proposé dans la note de travail WP5.1.

2.5 L'appendice 1 de la présente note de travail fournit des détails sur la mise en œuvre des activités prévues pour 2022.

3 ACTION PAR LA REUNION

3.1. La réunion est invitée à :

- a) Prendre connaissance des informations présentées dans cette note de travail de travail.
- b) Examiner les progrès de la mise en œuvre des activités du projet planifiées pour 2022 et fournir des orientations supplémentaires.

FIN

CODEVMET

Annexe 1 : Etat d'avancement de la mise en œuvre des activités du projet, année 2022

Objectifs / Livrables	# Activité	Activité	Statut	Résultats	Avantages à TOUS	Cameroun	Côte d'Ivoire	Sénégal	...	Commentaires
<i>Objectif 0 : Mettre en place des équipes d'experts compétents pour apporter une assistance aux États dans la mise en œuvre des activités du projet</i>										
Livrable 0.1 Sélectionner des experts ressources compétents pour apporter une assistance aux États dans la mise en œuvre des activités du projet	0.1.1	Sélectionner des experts-ressources pour soutenir les États mettant en œuvre le projet en rapport avec les défis en matière de MET		Quatre équipes d'experts en ressources (CAA (EN), CAA (FR), Prestataire de services (EN) et Prestataire de services (FR)) établies et formées sur la méthodologie du projet	TOUT					
	0.1.2	Mettre en place et former des équipes d'experts ressources sur la méthodologie du projet								
<i>Objectif 1 Aider les États AFI à renforcer la capacité de leur autorité de réglementation à assurer la supervision de la sécurité du service MET et la mise en œuvre du QMS en MET</i>										
Livrable 1.1 : Réglementations génériques, documents d'orientation, procédures opérationnelles, outils techniques, orientations et procédures relatives au SMQ	1.1.1	Organiser un séminaire d'introduction de 3 jours sur la supervision de la sécurité MET et le SMQ à l'intention des experts des États et des ressources (en ligne)		États mis à jour sur les objectifs du projet et la méthodologie de mise en œuvre	X					
	1.1.2	Élaborer / mettre à jour les réglementations génériques, les éléments indicatifs, les procédures opérationnelles, les outils techniques, les processus QMS et les orientations et procédures connexes, ainsi que toute autre ressource liée au système de supervision de la sécurité des États et à la mise en œuvre du système de gestion de la qualité dans le MET		1) Élaboration d'un projet de Kit de mise en œuvre du système de gestion de la qualité 2) Élaboration d'un projet kit de documents génériques sur la réglementation de la sécurité MET	X	X	X	X		
	1.1.3	Conduite d'un atelier de validation de 7 jours destiné aux experts et aux agents régionaux de l'OACI pour examiner et valider les réglementations génériques, les éléments indicatifs, les procédures opérationnelles, les outils techniques,		Kit de mise en œuvre du système de gestion de la qualité examiné et validé Documentation générique réglementaire de sécurité MET examinée et validée	X	X	X	X		

Objectifs / Livrables	# Activité	Activité	Statut	Résultats	Avantages à TOUS	Cameroun	Côte d'Ivoire	Sénégal	...	Commentaires
		les orientations et procédures liées au système de gestion de la qualité.								
Livrable 1.2 Soumission des plans d'action des États, suivi et assistance dans la mise en œuvre des activités liées à la supervision de la sécurité MET et au système de gestion de la qualité	1.2.1	Planifier et organiser des ateliers de cinq jours pour les États anglophones afin de les familiariser avec la documentation, les directives et les outils développés par les experts du projet et développer les plans d'action des États								Activité en préparation
	1.2.2	Planifier et organiser un atelier de cinq jours pour les États francophones afin de les familiariser avec la documentation, les lignes directrices et les outils développés ci-dessus et de convenir des plans d'action des États		<ul style="list-style-type: none"> 18 États et 1 ANSP familiarisés avec le dossier de mise en œuvre du projet 3 États aidés à élaborer le plan d'action de l'État 		X	X	X		
	1.2.3	Fournir un briefing aux experts du projet sur la mise en œuvre des activités du projet (en ligne)		Éléments introductifs sur la conduite des activités d'assistance liées au projet fournis à 5 experts						
	1.2.4	Soumettre à l'OACI, pour examen, les plans d'action des États pour l'amélioration de la supervision de la sécurité des services MET et pour la mise en œuvre du SMQ en MET		Projet d'action des États en cours de finalisation pour soumission au bureau régional de l'OACI WACAF		X	X	X		
	1.2.5	Suivi des progrès dans la mise en œuvre des plans d'action par les États		Projets de plans d'action en cours d'élaboration		X	X	X		
